

Proyecto de Software

Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Yency Karina Quiñonez Rodriguez

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingenieria – Ingenieria de Software Virt

Ingeniera: Ana Milena Mosquera Sevilla

04 de octubre del 2026

Introducción

En este proyecto presento la planificación de una solución de software para Kora Sport, un negocio dedicado a la venta de productos deportivos y casuales. La propuesta surge de la necesidad de mejorar la organización de la información relacionada con los productos, clientes, pedidos y ventas, ya que actualmente varios de estos procesos se realizan de manera manual.

El objetivo principal es establecer una planificación organizada que permita definir las actividades, recursos, tiempos, riesgos y costos necesarios para desarrollar la solución. Para ello, se plantean el alcance del proyecto, los objetivos, la estructura de desglose del trabajo, la matriz de riesgos, el cronograma y el presupuesto.

Considero que una buena planificación es importante para obtener resultados de calidad, ya que permite organizar mejor el trabajo, anticipar posibles dificultades y aprovechar adecuadamente los recursos disponibles. Por esta razón, durante el desarrollo del proyecto se busca mantener una comunicación clara y ordenada entre los integrantes del equipo, facilitando el cumplimiento de las actividades y permitiendo que la solución final responda a las necesidades de Kora Sport.

Descripción del problema

Kora Sport realiza la venta de sus productos principalmente por medio de redes sociales. Cuando un cliente se interesa por un par de zapatos, es necesario revisar manualmente la referencia y la talla disponible, acordar el precio, tomar los datos del cliente y coordinar la entrega o el envío. Actualmente, gran parte de esta información queda registrada en las conversaciones con los clientes y en controles realizados de manera manual.

A medida que aumentan las ventas y la cantidad de productos, este proceso puede generar dificultades para saber rápidamente qué referencias y tallas están disponibles, recordar el estado de cada pedido y consultar la información de ventas anteriores. También resulta más difícil llevar un control organizado de las compras, los gastos y las ganancias del negocio.

Esta situación puede ocasionar pérdida de tiempo, errores en la información y dificultades para atender oportunamente a los clientes. Por esta razón, surge la necesidad de buscar una alternativa que facilite la organización de la información y permita llevar un mejor control de las actividades que se realizan diariamente en Kora Sport.

Objetivo general

Desarrollar una solución de software para Kora Sport que permita organizar la información de los productos, pedidos y ventas, facilitando el control de las actividades comerciales y mejorando la atención a los clientes.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades de Kora Sport relacionadas con la gestión de productos, pedidos, ventas y clientes.
- Diseñar una solución de software que permita organizar y consultar de manera sencilla la información del negocio.
- Implementar funciones que faciliten el control de productos, disponibilidad, pedidos y ventas.
- Evaluar el funcionamiento de la solución para identificar posibles errores y verificar que responda a las necesidades de Kora Sport.

Justificación

El desarrollo de una solución de software para Kora Sport surge de la necesidad de mejorar la organización y el control de las actividades relacionadas con la venta de productos. Actualmente, gran parte de la información se maneja de forma manual y mediante conversaciones en redes sociales, lo que puede generar dificultades para consultar productos, pedidos y ventas.

Corto plazo: el proyecto permitirá organizar mejor la información de los productos y pedidos, facilitando el trabajo diario y reduciendo posibles errores en el registro de los datos.

Mediano plazo: se espera mejorar el seguimiento de las ventas y facilitar la consulta de información, permitiendo una atención más rápida y organizada a los clientes.

Largo plazo: la solución podrá contribuir al crecimiento de Kora Sport, proporcionando una herramienta que facilite la gestión del negocio y que pueda adaptarse a nuevas necesidades a medida que aumenten sus productos y ventas.

De esta manera, el proyecto busca dar respuesta a las necesidades de Kora Sport y ofrecer una solución que beneficie tanto la organización interna del negocio como la experiencia de los clientes.

Alcance del proyecto

El proyecto Kora Sport contempla el desarrollo de una solución de software orientada a mejorar la organización y gestión de las actividades relacionadas con la venta de productos deportivos y casuales. La solución permitirá organizar la información de los productos, consultar su disponibilidad, registrar y realizar seguimiento a los pedidos y mantener un control de las ventas realizadas.

El proyecto incluye el análisis de las necesidades del negocio, el diseño de la solución, el desarrollo de las funciones principales, las pruebas de funcionamiento y la documentación del sistema.

Restricciones


El proyecto estará limitado al tiempo y los recursos disponibles para su desarrollo. Además, inicialmente se enfocará en las funciones principales de gestión de productos, clientes, pedidos y ventas, sin contemplar procesos más avanzados como la integración directa con entidades bancarias, sistemas contables externos o servicios de envío, se podría contemplar para mas adelante.

Aceptación

Los criterios de aceptación serán que la solución permita registrar y consultar correctamente la información de los productos, controlar su disponibilidad, registrar los pedidos y ventas, y facilitar la consulta de la información de manera organizada. También se deberá comprobar mediante pruebas que las funciones principales operen correctamente y respondan a las necesidades identificadas en Kora Sport.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

EDT KORA SPORT

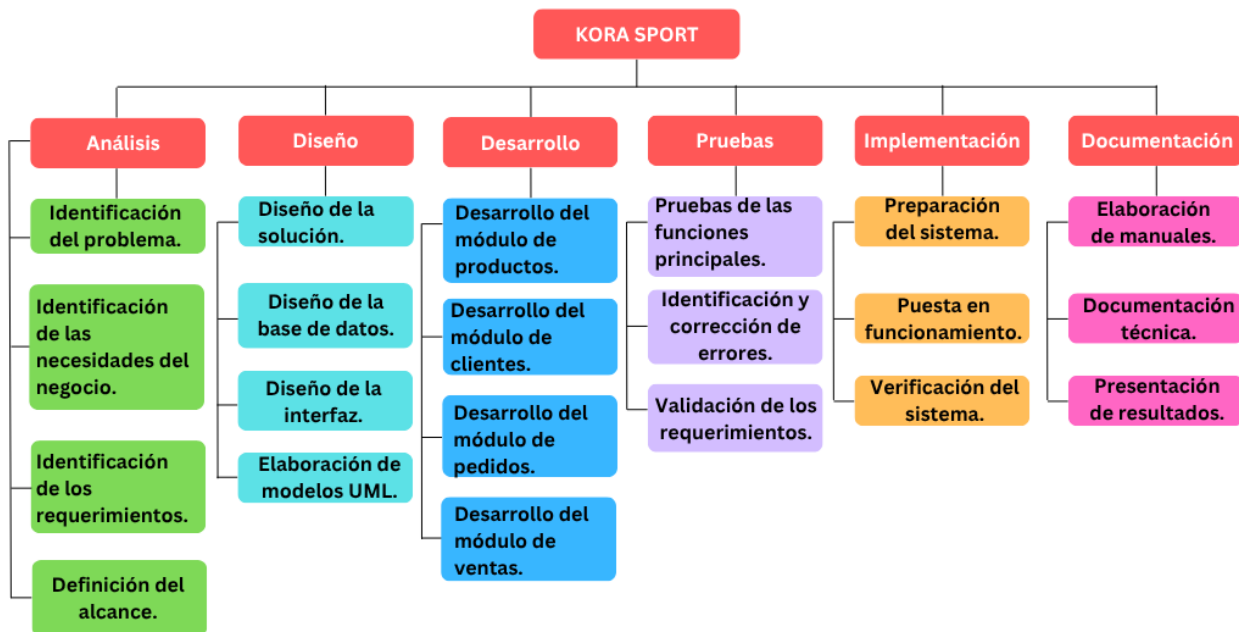

Matriz de riesgos

Id R	Descripción del riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Estrategia de respuesta	Plan de acción	Responsable
R01	Retrasos en el desarrollo de las actividades del proyecto.	Cronograma	Media	Alto	Alto	Mitigar	Realizar seguimiento al cronograma y priorizar las actividades pendientes.	Líder del proyecto
R02	Cambios en los requerimientos durante el desarrollo del sistema.	Alcance	Media	Alto	Alto	Mitigar	Revisar y documentar los requerimientos antes de realizar cambios en el sistema.	Analista
R03	Errores en el funcionamiento de las diferentes funciones del sistema.	Técnico	Media	Alto	Alto	Mitigar	Realizar pruebas periódicas y corregir los errores encontrados.	Desarrollador
R04	Pérdida o modificación accidental de la información.	Seguridad	Baja	Alto	Medio	Mitigar	Realizar copias de seguridad y establecer medidas básicas de protección de la información.	Desarrollador
R05	Falta de disponibilidad de alguno de los integrantes del equipo.	Recursos humanos	Media	Medio	Medio	Mitigar	Distribuir las actividades y mantener comunicación constante	Líder del proyecto

							entre los integrantes.	
R06	Limitaciones de tiempo o recursos para desarrollar todas las funciones propuestas.	Recursos	Media	Medio	Medio	Mitigar	Priorizar las funciones principales y ajustar las actividades según los recursos disponibles.	Líder del proyecto
R07	Dificultades de los usuarios para comprender o utilizar el sistema.	Usuario	Baja	Medio	Bajo	Mitigar	Diseñar una interfaz sencilla y realizar pruebas de uso antes de la implementación.	Diseñador
R08	Problemas técnicos durante la implementación del sistema.	Técnico	Baja	Alto	Medio	Mitigar	Realizar pruebas previas y establecer alternativas para solucionar posibles inconvenientes técnicos.	Desarrollador

Cronograma del proyecto

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN ESTIMADA	RESPONSABLE
1	ANÁLISIS	1 semana	Analista
1.1	Identificación del problema y necesidades del negocio	2 días	Analista
1.2	Identificación de los requerimientos	2 días	Analista
1.3	Definición del alcance	1 día	Líder del proyecto
2	DISEÑO	2 semanas	Diseñador

2.1	Diseño de la solución	2 días	Diseñador
2.2	Diseño de la base de datos	3 días	Diseñador
2.3	Diseño de la interfaz	3 días	Diseñador
2.4	Elaboracion de modelos UML	2 días	Diseñador
3	DESARROLLO	3 semanas	Desarrollador
3.1	Desarrollo del módulo de productos	4 días	Desarrollador
3.2	Desarrollo del módulo de clientes	3 días	Desarrollador
3.3	Desarrollo del módulo de pedidos	4 días	Desarrollador
3.4	Desarrollo del módulo de ventas	4 días	Desarrollador
4	PRUEBAS	1 semana	Desarrollador
4.1	Pruebas de las funciones principales	2 días	Desarrollador
4.2	Identificación y corrección de errores	2 días	Desarrollador
4.3	Validación de los requerimientos	1 día	Analista
5	IMPLEMENTACIÓN	1 semana	Desarrollador
5.1	Preparación del sistema	2 días	Desarrollador
5.2	Puesta en funcionamiento	2 días	Desarrollador
5.3	Verificación del sistema	1 día	Equipo de trabajo
6	DOCUMENTACIÓN	1 semana	Equipo de trabajo
6.1	Elaboración de manuales	2 días	Equipo de trabajo
6.2	Documentación técnica	2 días	Equipo de trabajo
6.3	Presentación de resultados	1 día	Equipo de trabajo

Presupuesto del proyecto

ID	RECURSO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
P01	Equipo de cómputo	Computador utilizado para el desarrollo y las pruebas del sistema	1	\$2.000.000	\$2.000.000

P02	Servicio de internet	Conexión a internet para desarrollo, investigación y pruebas	3 meses	\$80.000	\$240.000
P03	Hosting	Servicio para alojar el sistema durante la implementación	1	\$250.000	\$250.000
P04	Dominio web	Registro de dominio para el sistema	1	\$100.000	\$100.000
P05	Software y herramientas	Herramientas utilizadas para diseño, desarrollo y documentación	1	\$150.000	\$150.000
P06	Recursos humanos	Tiempo destinado al análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación	3 personas	\$1.000.000	\$3.000.000
P07	Contingencia	Recursos destinados a cubrir gastos imprevistos durante el proyecto	1	\$200.000	\$200.000
Total estimado				\$5.940.000	

Conclusiones

- Con el desarrollo de este taller comprendí la importancia de planificar adecuadamente un proyecto de software, ya que esto permite organizar las

actividades, los recursos, los tiempos y los responsables necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

- Durante el desarrollo del proyecto KORA SPORT pude identificar una necesidad real y plantear una solución de software que contribuya a mejorar la organización y el control de los procesos relacionados con las ventas, los productos y la información del negocio.
- Finalmente, considero que la elaboración de cada parte del taller me permitió fortalecer mis conocimientos sobre la formulación de proyectos de software y comprender que una buena planificación facilita el desarrollo ordenado del sistema y ayuda a prevenir posibles dificultades durante su ejecución.

BIBLIOGRAFIAS

(Liste acá los recursos en formato APA (instrucción para los autores))

Pressman, Roger S., (2021) Ingeniería de software. McGraw-Hill
Interamericana. Capitulo 24, 25, 26 página de la 490 a 548

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace página de la 14 a 18.
